Emmen, Umgestaltung Knoten Gersag
05.10.2026 / SPDA
Mst.: 1:500


Bauphase 5:

Geplante Arbeiten:
- Einrichten Baustelle inkl. Vorbereitungsarbeiten / Markierungen / Provisorien
- Belagsabbruch und Aushub Fundationsschicht
- Erstellung neue Werkleitungen und Strassenentwässerung
- Versetzen Randsteine
- Schalen+Betonieren Fundamente Signale
- Einbau neuer Fundationsschicht inkl. Verdichtung und Planie
- Einbau Trag- und Binderschicht im Fahrbahnbereich
- Einbau Belag im Geh- und Radwegbereich inkl. Deckschicht
- Auffüllungsarbeiten
- Erstellung prov. Markierung / Signalisation
- Oberboden anlegen und ansäen

Verkehrsführung:
- geänderte Verkehrsführung im Bereich Rüeggisingerstrasse Süd Bereich Titlisstrasse
- zweispurige Verkehrsführung Rüeggisingerstrasse Nord
- einspurige Verkehrsführung Rüeggisingerstrasse Süd (Einbahnstrasse)
- einspurige Verkehrsführung mit LSA entlang Titlisstrasse

Dauer:
ca. 03.11.2026 - Ende Januar
11 Wochen (3 Wochen Ferien: Weihnachten 18.12.2026 - 11.01.2027)

Montage der Umleitungssignalisation ausserhalb des Baustellenperimeters erfolgt durch die Gemeinde Emmen

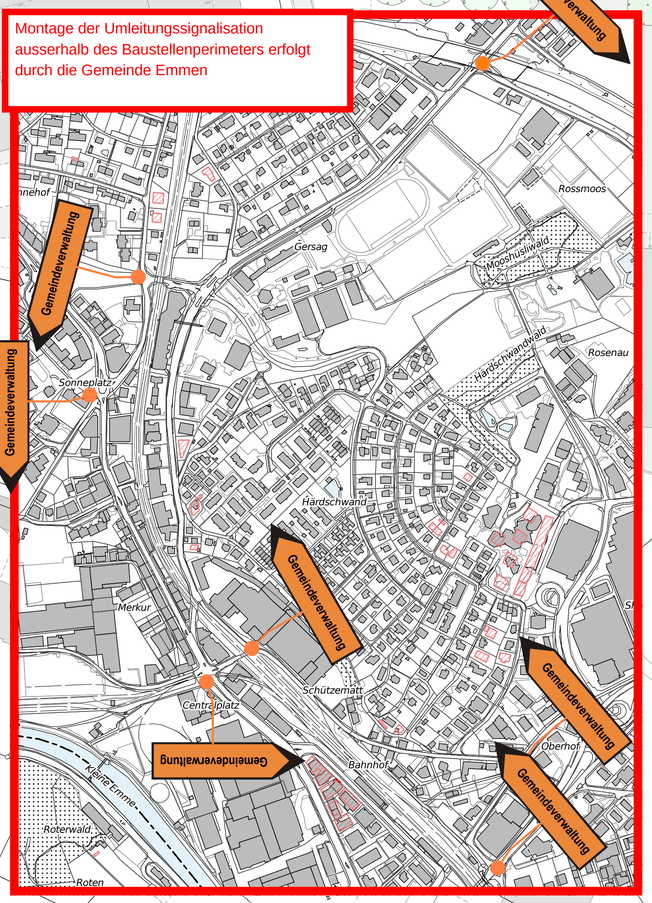

Gersagstrasse
Bahnhof Emmenbrücke Gersag
Titlisstrasse
Rüeggisingerstrasse
Bushaltestelle (41/42/43/44)
Bushaltestelle (41/42)
Bushaltestelle (43/44)
Installationsplatz (ca. 1200m2)
provisorische Umleit-Oberboden (ca. 180m2)
Randlinie + Piktogramm "Fahrrad" + Einspurpfeile beide Fahrbahnen gelb
Temporäre Markierung (weiss/gelb) erstellen
Randlinie gespritzt gelb
Randstein Typ Typ 12 spez | 3 anrampen für Aufgang Veloumleitung
Grünrabatte provisorische Befahrbarkeit herstellen
Befahrbarkeit herstellen
auf ersten 8m zus. (alle 100cm) auf Belag geschraubt, Total 15 Stk.
Markierte Mittelinsel erstellen prov. "Biene Maja" montieren
prov. Beleuchtung durch CKW in prov. Fundament
Doppelstabzaun
Absperrung Fussweg
Je nach Platzverhältnissen und Sichtverhältnissen anstelle LSA "auf Sicht fahren" --> wird vorgängig besprochen
Gersag
Kleine Emme
Roterwald
Roten
Rossmoos
Gersag
Mooshüsliwald
Härdschwandwald
Rosenau
Sonneplatz
Härdschwand
Merkur
Schützematt
Centralplatz
Oberhof
Bahnhof
